



RENDICIÓN DE CUENTAS 2018



RENDICIÓN DE CUENTAS ENERO A OCTUBRE 2018



PLAN DE DESARROLLO



Logros Obtenidos a Octubre 30 de 2018



Se han realizado 391 atenciones de emergencias por desabastecimiento de agua y colmataciones en la red de alcantarillado en 89 municipios, incluidas obras de rehabilitación

Se realizó acompañamiento o cofinanciación en el proceso de construcción u optimización de 13 PTAR en cascos urbanos o centros poblados.



AGUA POTABLE

Se logró la terminación de proyectos de acueducto que beneficiaron a 53.861 habitantes de la zona urbana del departamento

Se logró la terminación de un proyecto de acueducto que benefició a 3.350 habitantes de la zona rural del municipio de Tocaima

ALCANTARILLADO

Se logró la terminación de proyectos de alcantarillado urbano que beneficiaron a más de 90.815 habitantes en los municipios del Departamento



Logros Obtenidos a Octubre 30 de 2018



Se logró el fortalecimiento institucional en los componentes administrativo, comercial, financiero y técnico operativo, en 56 comunidades organizadas que prestan el servicio de acueducto



Se realizó la entrega de 18 vehículos compactadores

Se logró la implementación del módulo de capacitaciones de operadores de planta de agua potable



UNIDADES SANITARIAS

Se logró la terminación de 2.088 unidades sanitarias que beneficiaron a más de 8.352 personas de la zona rural de 59 municipios con una inversión de \$26.013 millones

2.005 unidades sanitarias en ejecución por \$24.979 millones



INTRADOMICILIARIAS

Se realizó la entrega
de 64 conexiones
intradomiciliarias en 6
municipios con una
inversión de \$280
millones



Se logró la terminación de 34
nuevas Plantas de Tratamiento de
Agua Potable, incluyendo el
componente pedagógico, en las
escuelas rurales del Departamento



OPERATIVA Y TÉCNICA

OBRAS EJECUTADAS



CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL EN MUNICIPIOS DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Valor: \$ 22,446,932,989

Población beneficiada: 8.352 hab.

Alcance: Construcción de 2,088 unidades sanitarias en la zona rural en 62 municipios del departamento de Cundinamarca, que están conformadas por: unidad sanitaria, lavadero y sistema de tratamiento para las aguas negras y servidas.

Estado: Obra en ejecución y en funcionamiento.



CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS DEL BARRIO EL PORVENIR RIO MUNICIPIO DE MOSQUERA FASE I

Valor: \$ 4.753.256.594,00

Población beneficiada: 5.265 Habitantes.

Alcance: Construcción de la estación de bombeo Pluvial Porvenir Rio, con la cual se evacuaran las aguas lluvias que se generen al rio Bogotá, dicha estación cuenta con cuatro bombas sumergibles de flujo mixto de 170 hp capacidad, un tanque de llegada, una estructura de descarga, una caseta de control donde se encuentran todos los equipos, elementos eléctricos incluyendo planta eléctrica de 200 kw trifásica un transformador tipo seco, tableros de control.

Estado: Obra ejecutada en un 95% , pendiente energización por parte de CODENSA.



OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDAL LA FLORESTA SECTOR I MEDIANTE LA INTERCONEXIÓN CON EL ACUEDUCTO URBANO DE GUASCA

Valor: \$1.267.920.161,00

Población beneficiada: 956 hab.

Alcance: contempló la siguientes actividades: construcción de tanque de almacenamiento de mínimo 87m³, instalación de líneas de distribución (13 km), instalación de macromedidores, válvulas reguladoras de presión, válvulas de corte, válvulas de purga y ventosas en la red de distribución, además se realizarán acometidas con conexiones domiciliarias y pasos elevados.

Estado: Obra ejecutada al 100% - En proceso de liquidación, se están haciendo pruebas al sistema por parte del Municipio.



CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO URBANO DE CAJICA – CUNDINAMARCA ETAPA I

Valor: \$8.385.593.600,00

Población beneficiada: 8.000 hab.

Alcance: Construcción de Colectores Principales de Alcantarillado Pluvial y Sanitario – (obras preliminares, instalación de 3,479m de alcantarillado pluvial en tubería de 12”, 14”, 16”, 18”, 20” y 24” y 1,698m de alcantarillado sanitario en tubería de 10”, 12”, 14”, 18”, 20”, 24” y 27”, Construcción de Pozos de inspección, sumideros, Construcción de 467,57m de colector final en tubería de 48”, Construcción de 13,5m de Túnel Linner, reconstrucción de pavimento 100%, conexión de sumideros existentes, reparación de andenes, adecuación de la vía del colector final con terraplén, barandas y revestimiento del canal en piedra pegada y construcción de cercas en alambres de púas.

Estado: Obra ejecutada en un 100% y en funcionamiento – En proceso de Liquidación



CONSTRUCCION OBRAS PARA OPTIMIZACION DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CENTRO POBLADO MAYA MUNICIPIO DE PARATEBUENO. FASE I

Valor: \$3.983.516.193,00

Población beneficiada: 1.760 hab.

Alcance: Construcción de 5066 ml de red de conducción del Acueducto en tubería de polietileno de alta densidad de 4" – con obras de protección y 4 Viaductos, construcción de un nuevo tanque de almacenamiento de 82 M3, adecuación, mejoramiento y puesta en operación de la PTAP (3,6 lts/seg), construcción de redes de alcantarillado sanitario (25 pozos y 99 acometidas y 1867 ml de tubería de Novafort 8"), construcción de redes de sistema de alcantarillado pluvial: (suministro de 2.223 ml tubería alcantarillado corrugada de diámetros que van desde 10" hasta 39", 24 pozo, 25 sumideros laterales, 3 sumideros transversales y un cabezal de descarga

Estado: Obra ejecutada en un 100% y en funcionamiento – En proceso de liquidación



CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL LA SALADA, ALTO DE LA VIGA, VILA, ASOMADERO Y MALBERTO DEL MUNICIPIO DE TOCAIMA

Valor: \$3.207.963.518,00

Población beneficiada: 4.868 hab.

Alcance: Terminación conducción tanque de almacenamiento de Tocaima a tanques de almacenamiento acueducto la salada en una longitud de 9.370 m de tubería UM RDE 26 de 6" de los cuales el municipio cuenta con el almacenamiento de 7.920 m. Construcción de 31 pasos aéreos rígidos y 4 cruces sin zanja, Optimización de tanques de almacenamiento. Instalación de macromedidores, construcción de redes de distribución en una longitud de 17.348 ml en tubería PVC de 8", 4" 3" y 2".

Estado: Obra ejecutada 100% - contrato de obra liquidado.



CONSTRUCCION OBRA PRIORITARIA REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL CENTRO URBANO MUNICIPIO DE ALBAN CUNDINAMARCA.

Valor: \$ 1.178.767346

Población beneficiada: 2.481 hab.

Alcance: Construcción de alcantarillado sanitario y pluvial – Suministro e instalación de 1027,57ml de tubería PVC para alcantarillado sanitario y pluvial de la siguiente manera:

Sanitario PVC 6" : 270ML, PVC 8" : 377,77 en Pluvial- PVC 10" : 120ML, PVC 10" : 120ML, PVC 10" : 120ML, PVC 20" : 32,68ML, PVC 24" : 165,51ML, PVC 30" : 61,61ML, Suministro e instalación de 20 Pozos de inspección así: sanitario en 10 pozos y pluvial en 10 pozos. Construcción de 71 domiciliarias, construcción de cabezal de entrega.

Estado: Obra ejecutada en un 100% y en funcionamiento – Liquidado



CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL MUNICIPIO DE PULÍ

Valor: \$1.031.626.061.23

Población beneficiada: 656 hab.

Alcance: Construcción de Acueducto - obras preliminares, tubería y accesorios de acueducto (instalación de tubería y accesorios pvc de 2" a 4" 702,19 un, redes de distribución de alcantarillado sanitario (pozos y cajas de inspección 20 un. suministro de tubería alcantarillado 6" 479,60 ml 8" 627,85 ml, redes de sistema de alcantarillado pluvial: (suministro de tubería alcantarillado 8" 818,63 ml, 10" 44.40 ml, 12" 236,89, pozos y cajas de inspección 30 un, sumideros 46, instalación de un hidrante, instalación de válvulas 11, instalación de 1 macro medidor, reconstrucción de pavimento 100%.

Estado: Obra ejecutada en un 100% y en funcionamiento – Liquidado



CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GAMA-CUNDINAMARCA

Valor: \$ 2.655.419.114.73

Población beneficiada: 805 hab.

Alcance: Redes de alcantarillado sanitario mediante el suministro e instalación de 1272m de tubería PVC en diámetros de 6" y 8", incluye 101 domiciliarias, 30 pozos de inspección, entibado y demás actividades para su puesta en funcionamiento. Redes de alcantarillado pluvial mediante el suministro instalación de 1544m de tubería PVC en diámetro entre 16" y 42", 46 pozos de inspección, entibados.

Estado: Obra ejecutada en un 100% y en funcionamiento – Liquidado



CONSTRUCCION COLECTORES MATRICES DEL SECTOR CARTAGENITA MANABLANCA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA FASE IV

Valor: \$ 2,273,206,458

Población beneficiada: 11.000 hab.

Alcance: La construcción colectores matrices del sector Cartagenita-Manablanca del municipio de Facatativa Fase IV, contempla la construcción en tubería PVC de los tramos del pozo 100 al pozo 113, desagregados de la siguiente forma. 35ml de tubería PVC de 10", 36ml de tubería PVC de 12", 29,3ml de tubería PVC de 14", 40ml de tubería PVC de 10" 52,1ml de tubería PVC de 18", 189.7ml de tubería PVC 24", 50.6ml de tubería PVC de 27", 44.5ml de tubería PVC de 30", 64,5ml de tubería PVC de 36", incluye actividades como excavación, relleno, demolición y reconstrucción de pavimento y andenes, además se construirán 17 pozos de inspección, 3 cámaras de conexión, 28 sumideros nuevos, conexión de sumideros existentes.

Estado: Obra ejecutada en un 100% y en funcionamiento
– Liquidado



CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO VIA LOS ALPES – TENA CUNDINAMARCA

Valor: \$467.479.721

Población beneficiada: 114 hab.

Alcance: El proyecto contempla el suministro e instalación de una red principal en tubería PVC de 10", acometidas de alcantarillado para la conexión de las viviendas en tubería PVC de 6", cajas de inspección, colillas de alcantarillado para las futuras conexiones a la red de las vías aferentes en tubería PVC de 8", pozos de inspección, excavaciones, rellenos, demoliciones, recuperación de cunetas, andenes y bordillos afectados

Estado: Obra ejecutada en un 100% y en funcionamiento – Liquidado



OPTIMIZACIÓN REDES DE AGUA POTABLE TANQUE CASABLANCA, SECTOR CALLE CENTRO, CALLE SÉPTIMA, PARQUE DE LAS FLORES EL CHARQUITO, MUNICIPIO DE MADRID - CUNDINAMARCA

Valor: \$2.680.556.361,50

Población beneficiada: 42.000 hab.

Alcance: Construcción de acometidas en 204 viviendas, Suministro e instalación de accesorios en PVC y HD tales como: Codos, reducciones, tapones, Válvulas, uniones, Tee's, cruces, de 3", 6", 8", 10", 12" y 16", igualmente hidrantes de 3", con sus correspondientes anclajes en concreto simple (2.500 PSI), Reposición de andenes (176,15 m²), cunetas (96,52 m³), bordillos (256,50 ml.), asfalto (303,92 m³) y pavimento rígido MR 41 (70,76m³), Demolición andenes, cunetas y pavimentos, excavaciones mecánica y manual (5.952,74 m³), entibado metálico (2.541,27 m²)

Estado: Obra ejecutada en un 100% y en funcionamiento – En proceso de liquidación



OPERATIVA Y TÉCNICA

PROYECTOS




RESUMEN PROYECTOS (octubre 30 de 2018)

	ESTADO	CANTIDAD
PROYECTOS EXISTENTES	Con Diseño por Radicar (incluye compactadores e intradomiciliarias)	12
	En Evaluación	10
	En Ajuste	101
	Ajustados en Evaluación	36
	Con Concepto Técnico Favorable	0
	Viabilizados	22
	TOTAL PROYECTOS EXISTENTES	181
PROYECTOS REFORMULACIÓN	En Reformulación	5
	Reformulados	2
	TOTAL REFORMULADOS	7
PROYECTOS NUEVOS	Diseños en Ejecución	41
	Diseños por Contratar	6
	TOTAL PROYECTOS NUEVOS	47

PROYECTOS MECANISMOS DE VIABILIZACIÓN (Octubre 30 de 2018)

PROYECTOS RADICADOS EN EL MVCT Y EN EL MECANISMO DEPARTAMENTAL DE EVALUCIÓN Y VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS.		
ESTADO DEL PROYECTO	N°	VALOR
Sin Lista	10	\$103.428.383.964
Ajustes Radicados	36	\$117.885.813.606
En Ajustes	101	\$313.280.240.033
Conceptos Favorables	0	\$
Viabilizado	22	\$85.350.281.164
Reformulado	2	\$8.158.789.080
TOTAL	157	\$628.103.507.847

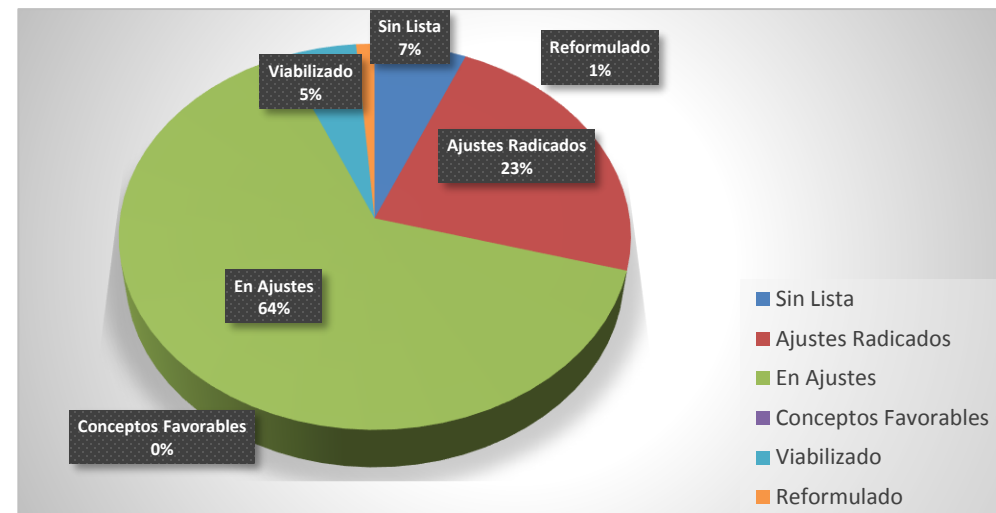

PROYECTOS RADICADOS EN EL MECANISMO DEPARTAMENTAL DE EVALUCIÓN Y VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS.		
ESTADO DEL PROYECTO	N°	VALOR
Sin Lista	2	\$2.765.358.078
Ajustes Radicados	13	\$39.433.820.385
En Ajustes	41	\$75.887.206.245
Conceptos Favorables	0	\$0
Viabilizado	17	\$32.621.553.357
Reformulado	1	\$6.506.341.954
TOTAL	60	\$157.214.280.019

PROYECTOS RADICADOS EN EL MVCT		
ESTADO DEL PROYECTO	N°	VALOR
Sin Lista	8	\$100.663.025.886
Ajustes Radicados	23	\$78.451.993.221
En Ajustes	60	\$237.393.033.788
Conceptos Favorables	0	\$
Viabilizado	5	\$52.728.727.807
Reformulado	1	\$1.652.447.126
TOTAL	97	\$470.889.227.828

OPERATIVA Y TÉCNICA

EMERGENCIAS



ARTENCIÓN DE EMERGENCIAS (octubre 30 de 2018)

AVANCES 2018			
EMERGENCIA	No ATENCIONES	VALOR	MUNICIPIOS ATENDIDOS
Carrotanque	203	\$ 591.268.225	39
Obra Civil	25	\$ 840.934.786	20
Lavado de Redes	163	\$ 877.522.384	69
TOTAL	391	\$ 2.309.725.395	89



OPERATIVA Y TÉCNICA

AMBIENTAL



VEHÍCULOS COMPACTADORES

Durante el 2018 se han entregado 18 vehículos compactadores en 14 Municipios del Departamento, beneficiando a 350.579 habitantes. Este proyecto ha tenido una inversión de \$ 6.913.713.495 durante el 2018.

No.	MUNICIPIO OPERADOR	CAPACIDAD Yd ³	VALOR	POBLACIÓN BENEFICIADA (habitantes)
1	La Mesa	25	\$ 432.709.318,00	29.931
2	Fusagasugá	25	\$ 432.709.318,00	129.768
3	Fosca	12	\$ 348.907.488,00	2.258
4	Vergara	12	\$ 348.907.488,00	5.736
5	Manta	12	\$ 348.907.488,00	1.542
6	Fúquene	12	\$ 348.907.488,00	3.246
7	Tocancipá	3 (1 de 25 y 2 de 16)	\$ 1.190.280.274,00	33.421
8	Chipaque	16	\$ 378.785.478,00	3.368
9	Ubaque	12	\$ 348.907.488,00	2.860
10	Carmen de Carupa	12	\$ 348.907.488,00	5.643
11	Guasca	16	\$ 378.641.621,50	14.644
12	Guataquí	16	\$ 378.641.621,50	5.647
13	Villeta	2 de 16	\$ 757.283.243,00	26.083
14	Cajicá	2 de 25	\$ 871.217.693,00	86.432
TOTAL		18	\$ 6.913.713.495,00	350.579

CUENCA RÍO BOGOTÁ

PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO – ORDEN 4.20



ACTIVIDADES /PROYECTOS

- Estudios y diseños PMAA
- Diseños Colectores
- Diseños de Acueductos
- Diagnostico de redes
- Diseños de ampliación de acueducto
- Actualización áreas de prestación de servicios

TIPO DE GASTO

PREINVERSIÓN	INVERSIÓN	TOTAL
\$ 3.272.058.746	\$ 26.525.289.886	\$ 29.797.348.632

FUENTE

DEPARTAMENTO	%	MUNICIPIO	%	OTROS	%
\$ 14.423.413.008	48,41	\$ 6.837.280.099	22,95	\$ 8.536.556.525	28.65

CUENCA RÍO BOGOTÁ

PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS – ORDEN 4.21

Realizar, revisar y/o ajustar los planes de saneamiento y manejo de vertimientos de los municipios en la Cuenca.



ACTIVIDADES / PROYECTOS

- Se encuentra en proceso de contratación 5 proyectos en los municipios de: El Rosal, Tenjo, Chipaque, Cucunubá y Nemocón.
- Se entregaron 4 PSMV en los municipios de: Cachipay, Apulo, Facatativá y Anolaima.
- La Corporación aprobó el PSMV del municipio de Viotá

TIPO DE GASTO

PREINVERSIÓN	INVERSIÓN	TOTAL
\$ 340.438.813	-	\$ 340.438.813

FUENTE

DEPARTAMENTO	%	MUNICIPIO	%	OTROS	%
\$263.738.813	77.47	\$76.700.000	22.53	--	--

CUENCA RÍO BOGOTÁ

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS – ORDEN 4.22

Realizar, revisar y/o ajustar los planes de gestión integral de residuos sólidos de los municipios en la Cuenca.



ACTIVIDADES /PROYECTOS

- Se encuentra en proceso de contratación 3 proyectos en los municipios de: Tocaima, La Calera y Bojacá.
- Se entregaron 5 vehículos compactadores e los municipios de Tocancipá y Cajicá.

TIPO DE GASTO

PREINVERSIÓN	INVERSIÓN	TOTAL
\$2.695.130.973	-	\$2.695.130.973

FUENTE

DEPARTAMENTO	%	MUNICIPIO	%	OTROS	%
\$1.111.622.531	41.24	\$1.583.508.442	58.75	--	--

CUENCA RÍO BOGOTÁ

PLAN DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA – ORDEN 4.33
Acompañamiento a todos los municipios de la cuenca en la estructuración de los PUEAA



ACTIVIDADES
/PROYECTOS

- Se encuentra en proceso de contratación 2 proyectos en los municipios de: Bojacá y Viotá.

TIPO DE GASTO

PREINVERSIÓN	INVERSIÓN	TOTAL
\$61.360.000	-	\$61.360.000

FUENTE

DEPARTAMENTO	%	MUNICIPIO	%	OTROS	%
\$31.860.000	51.92	\$29.500.000	48.07	--	--

CUENCA RÍO BOGOTÁ

OFERTA DEL RECURSO HÍDRICO – ORDEN 4.34.1

Proyectos relacionados con agua subterránea, embalses-Pre-factibilidad de embalses-Estudios geofísicos y elaboración de modelos hidrogeológicos de aguas subterráneas



ACTIVIDADES

- Se realizó la contratación de la consultoría “ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE EMBALSE DE LA PROVINCIA DE SUMAPAZ”, por un valor de \$440.719.475.
- Se contrataron los estudios y diseños de las redes de aducción entre la línea exprés Embalse Calandaima - Apulo - Tocaima y diez acueductos (3 del municipio de El Colegio, 1 de Apulo y 6 de Viotá).
- Análisis y actualización de prefactibilidad de embalses, incluyendo oferta-demanda del municipio de Facatativá

TIPO DE GASTO		
PREINVERSIÓN	INVERSIÓN	TOTAL
\$1.700.829.026	-	\$1.700.829.026

FUENTE					
DEPARTAMENTO	%	MUNICIPIO	%	OTROS	%
\$1.223.261.026	71.92	\$477.568.000	28.07	--	--

CUENCA RÍO BOGOTÁ

ABASTECIMIENTO HÍDRICO – ORDEN 4.34.2



ACTIVIDADES /PROYECTOS

- Acueductos rurales cuenca baja.
- Proyecto acueducto La Mesa – Anapoima.
- Fortalecimiento a los prestadores de la cuenca.
- Atención de emergencias.
- Asistencia técnica.
- Apoyo autorizaciones sanitarias.

TIPO DE GASTO

PREINVERSIÓN	INVERSIÓN	TOTAL
\$ 2.268.526.224	\$ 4.510.156.828	\$ 6.778.683.052

FUENTE

DEPARTAMENTO	%	MUNICIPIO	%	OTROS	%
\$ 4.483.290.289	66,14	\$ 2.295.392.763	33,86	-	-

CUENCA RÍO BOGOTÁ

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - ORDEN 4.57.1
ASISTENCIA TECNICA - ORDEN 4.57.2



ACTIVIDADES /PROYECTOS

- Se encuentra en proceso de contratación 1 proyecto en el municipio de: Granada
- Se encuentran en ejecución 4 proyectos en los municipios de: , Subachoque, Anolaima, La Mesa y Tocaima.

TIPO DE GASTO

PREINVERSIÓN	INVERSIÓN	TOTAL
\$ 1.242.574.344	-	\$ 1.242.574.344

FUENTE

DEPARTAMENTO	%	MUNICIPIO	%	OTROS	%
\$ 283.974.344	22,85	\$ 958.600.000	77,15		0,00



CUENCA RÍO BOGOTÁ

DÍA MUNDIAL DEL AGUA – ORDEN 4.72 – 4.74



ACTIVIDADES /PROYECTOS

- Apoyo a las celebraciones conjuntas con la Secretaria de Ambiente y municipios.
- Actividades lúdicas, ambientales y ecológicas en marco del programa “Agua, Vida y Saber” que concluye con la instalación de PTAP en las instituciones rurales.

TIPO DE GASTO		
PREINVERSIÓN	INVERSIÓN	TOTAL
--	\$ 522.889.349	\$ 522.889.349

FUENTE					
DEPARTAMENTO	%	MUNICIPIO	%	OTROS	%
\$ 522.889.349	100	-	-	-	-

PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV)

A corte del mes de Octubre de 2018, se entregaron 7 PSMV a los municipios para evaluación por parte de la Autoridad Ambiental, y fueron aprobados por la autoridad ambiental 7 PSMV

ENTREGADOS 2018 (7)

Cachipay
Venecia
Apulo (CP Las Mezeta)
Facatativá (CP Santa Marta)
Paratebueno (CP Guaicaramo)
Fosca (CP Sáname)
Anolaima (CP Corralejas y Reventones)

APROBADOS 2018 (7)

Simijaca (AU)
Viotá (CP El Piñal)
Utica (AU)
Silvania (CP Agua Bonita)
Peñón (CP Talauta)
Peñón (CP Guayabal de Toledo)
Pulí (Inspección Palestina)

PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV)

EN PROCESO DE CONTRATACIÓN (23)

Sasaima (AU)	Sasaima (CP Santa Inés)
Villeta (AU)	Guayabetal (AU)
Beltrán (AU)	Chipaqué (AU)
Jerusalén (AU)	Cáqueza (AU)
Nilo (AU)	Gutiérrez (AU)
Tenjo (AU)	Ubaque (AU)
Nemocón (AU)	Choachí (AU)
El Rosal (AU y Centros Poblados Cruz Verde, Puente Rosal y San Antonio)	Une (AU)
Guaduas (AU)	Quetame
Guaduas (Centro Poblado Puerto Bogotá)	Paratebueno
Susa (AU)	Cucunuba (AU)

Veintidós (22) PSMV en Veinte (20) municipios del departamento por un valor de **\$1.170.530.886.**



PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV)

POR CONTRATAR (6)

Paimé (Centro Poblado
Cuatro Caminos y Centro
Poblado Tudela)

Topaipi (AU)

Quebrada Negra (AU)

Carmen de Carupa (AU)

San Juan de Rioseco (AU)

Pandi (AU)

**Proceso que se proyecta para el mes
de Diciembre 2018, para tramitar la
actualización de PSMV por un monto de
\$275.000.000.**

PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV)



Recorrido Vertimientos Facatativá
(Área Urbana y CP Santa Martha)



Recorrido Vertimientos Facatativá
(Área Urbana y CP Santa Martha)



Recorrido Vertimientos
Tocaima (Área Urbana)

PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS)

- Se entregaron PGIRS a los municipios de: Susa, Beltrán, Sesquilé, Nimaima, El Colegio, Arbeláez, Topaipí, Cáqueza y Nocaima
- Inversión por \$311.813.320,00
- Se realizó convenio para la implementación del PGIRS de La Calera por un valor de \$225,000,000
- Se encuentra en la etapa precontractual solicitud de contratación para los municipios de Guaduas, Puerto Salgar, Tocaima y Bojacá para Revisión, formulación, ajustes y/o actualización de los planes de gestión integral de residuos sólidos-PGIRS-para municipios del Departamento de Cundinamarca, enmarcados dentro del Plan Departamental de Aguas, por un valor de \$200.000.000.



Entrega del PGIRS Municipio de Susa

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES (PTAR)



PREINVERSION CONTRATADA

- Arbeláez
- Anolaima
- La Mesa
- Tocaima
- San Cayetano
- Subachoque

Valor Total
\$1.464.379.490

EN PROCESO DE CONTRATACIÓN

- Paratebueno (CP Maya)

Valor Total
\$182.933.440

RECURSOS APROBADOS

- Guachetá
- Vianí
- Granada

Valor Total
\$932.457.858

COMPROMETIDO 2018 \$ 3.579.770.788

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES (PTAR)



CONSTRUCCIÓN PTAR UBATE

Se aprobaron en
Comité Directivo PDA
los recursos
adicionales para
construir la primera
Fase de la **PTAR de
Ubaté** por un valor de
\$1.000.000.000.

El proyecto se
encuentra en
reformulación

ASEGURAMIENTO



IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS OPERATIVAS EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE. (PTAP)

Programa implementación de buenas prácticas operativas en sistemas de tratamiento de agua potable. Se realizan fortalecimientos técnicos con apoyo del laboratorio móvil, que incluye el análisis fisicoquímico y microbiológico del agua cruda y el agua para consumo humano. .. Los sistemas de potabilización fortalecidos son : La Mesa – Acuapesquera, Guachetá - Acueducto No. 3, Paratebueno, Medina, Ubalá, Caparrapí, Viotá, Zipacón, Beltrán, Topaipí, La Vega, Silvania, Apulo, Quetame, Quipile, Cachipay, Pandi, Guatavita y Tocaima.



. IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS OPERATIVAS EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE. (PTAP)

Se firmó contrato EPC-O-384-2018 por la suma de \$311'855.576 cuyo objeto es el fortalecimiento técnico operativo de 10 plantas de tratamiento de agua potable en el departamento de Cundinamarca.

Se firmó contrato EPC-O-299-2018 por la suma de \$137'401.616 cuyo objeto es el fortalecimiento técnico y puesta en marcha de la PTAP del municipio de Puerto Salgar.



IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS OPERATIVAS EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)



Determinación de eficiencia de PTAR en los parámetros DBO, DQO, SST y Ssed; Y, las cargas orgánicas por DBO,. Implementación de 114 BPS - determinación de caudales por población residente, de infiltración y lluvias; Se ha determinado la DBO, DQO, SST y Ssed; Y, las cargas orgánicas por DBO, SST y la tasa retributiva establecida por la CAR. Actividad realizada en los prestadores de Zipaquirá, Tocancipá, Guatavita, Sopó, Nemocón, El Rosal, La Calera y Funza.

Se realizó contrato EPC-PS-383 de 2018 por valor de \$ 85'194.480 para realizar la caracterización de aguas residuales de 12 PTAR urbanas.



ASISTENCIA TÉCNICA OPERACIONAL EN REDES DE ACUEDUCTO



Programa de asistencia técnica para la detección de fugas, conexiones fraudulentas, en redes de acueducto, se realizaron visitas en 18 municipios: Apulo, Villeta, Guasca, Fusagasugá, Venecia, Vergara, Pacho, Paratebueno, Guayabal de Siquima, Pulí, La Mesa, Anapoima, Pandi, Viotá, Cajicá, Cáqueza, Arbeláez, San Antonio del Tequendama, Bojacá. Las actividades se realizaron con los equipos de la unidad de detección de fugas de la Empresa.



ASISTENCIA TÉCNICA OPERACIONAL EN REDES DE ALCANTARILLADO




Programa de asistencia técnica para la inspección de redes de alcantarillado se realizaron visitas en 15 municipios: Villeta, Guasca, Fusagasugá, Venecia, Vergara, Pacho, La Mesa, Anapoima, Pandi, Viotá, Cajicá, Cáqueza, Arbeláez, San Antonio del Tequendama y Bojacá. Las actividades se realizaron con los equipos de la unidad de detección de fugas de la Empresa.



REGIONALIZACIÓN: 1.- Fruticas ; 2.- Calandaima.

Localización hidrográfica del embalse Calandaima

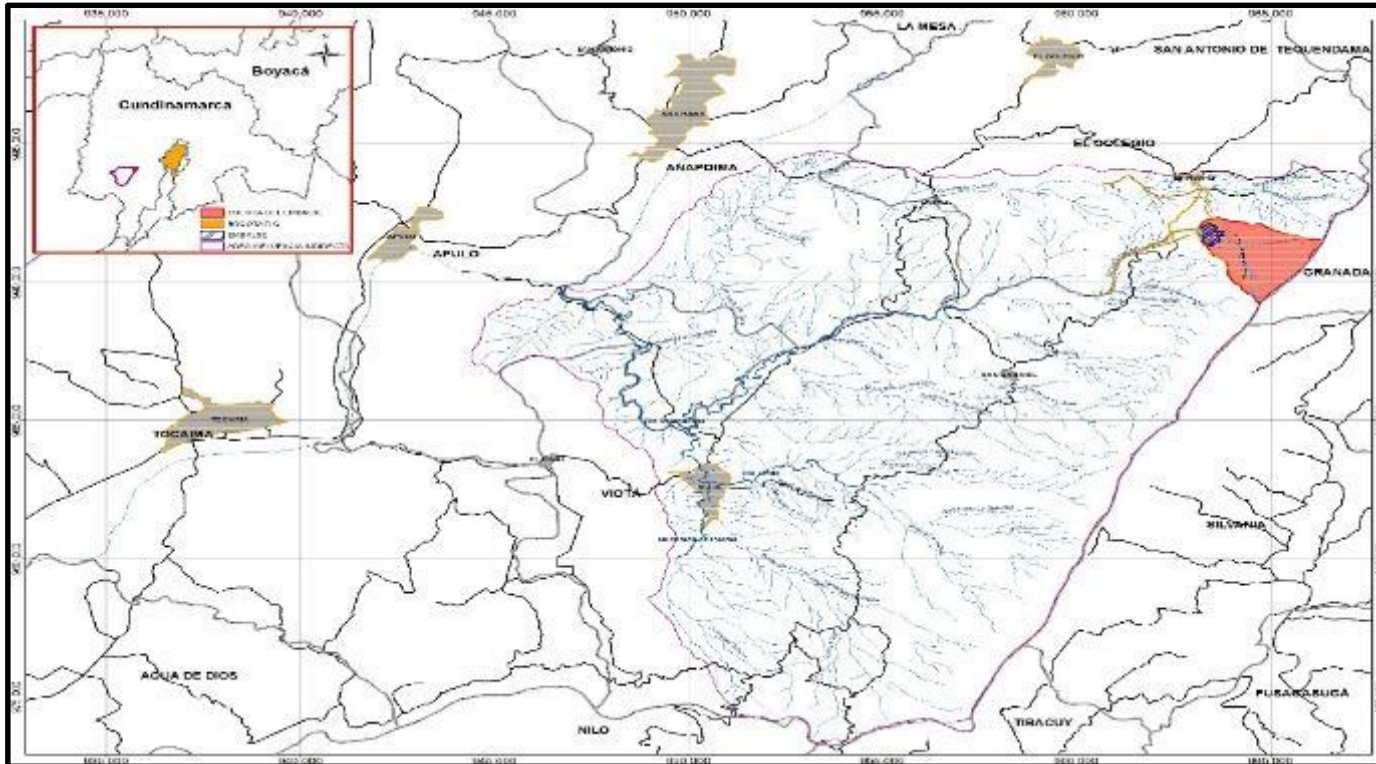

Se ha realizado la evaluación de las alternativas empresariales que se encarguen de la administración y operación de estos esquemas de acueducto rurales; así como la primera estructuración de costos y tarifas de la prestación para los dos esquemas operacionales. Para el regional Fruticas, se ha realizado el estudio de viabilidad financiera para el esquema de operación.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A PRESTADORES EXISTENTES

Se han realizado 20 diagnósticos y planes de fortalecimiento para cumplir con el componente de aseguramiento descrito en la resolución 1.063 de 2016 para la viabilidad de proyectos ante la ventanilla nacional del MVCT y la ventanilla departamental.



AGUA A LA VEREDA

Con una Inversión de \$ 4.471 millones de pesos, EL 17 de agosto se cerro la tercera (3a) convocatoria para seleccionar a setenta (70) nuevos prestadores rurales de acueducto; Y, el 04 de octubre se firma convenio interadministrativo EPC-CI-005 de 2018 con FONDECUN para la ejecución del programa AGUA A LA VEREDA en la actual Vigencia.



GRANDES PROYECTOS



ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA - ANAPOIMA

Desde hace más de 10 años se ha venido buscando una solución definitiva a través del “Acueducto Regional La Mesa – Anapoima”



Contrato 1-02-26200-728-2004
ESTUDIOS Y ASESORÍAS
HIDRÁULICAS ACUEDUCTO
REGIONAL DEL BAJO
TEQUENDAMA
LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA
POTABLE
MADRID – LA MESA - ANAPOIMA

2005

Contrato de Obra
EPC-O-042-2010
Fase IV

2010



Viabilidad proyecto:
“Construcción y puesta en
Marcha Acueducto Regional
La Mesa – Anapoima” Fase 5”

Viabilizado Sesión Comité
Técnico VASB No. 33 del 22 de
junio de 2015

2015

2006
Contrato de Obra
SOP-A-194-2006
Fase I

2007
• Contrato de Obra
SOP-A-247-2007
Fase II
• Contrato de Obra
SOP-A-269-2007
Fase III

2013
Consultoría de
Diagnóstico y Revisión
integral
EPC-C-200-2013

2016
Oposición de la
comunidad a construcción
de Pozos Profundos
Necesidad de
Reformulación
06 de mayo de 2016



ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA - ANAPOIMA

Tras los incumplimientos en contratos de obra previos, con el fin de garantizar una fuente de abastecimiento para el acueducto regional, en 2016 EPC suscribió un convenio con la EAAB, cuyo objeto es:

“Aunar esfuerzos entre el ACUEDUCTO DE BOGOTÁ y EPC para el suministro de agua potable a los municipios de la región del Bajo Tequendama del Departamento de Cundinamarca”

Fase 1: 150 LPS desde las 11:00pm hasta las 4:00am
Con culminación de obras rehabilitación Madrid – La Mesa
Equivalente a un aumento de caudal de 31,25 LPS continuos

2019

Fase 2: Hasta 200 LPS las 24 horas
Con culminación de obras ampliación red matriz a municipios de Occidente y Bajo Tequendama
24 horas diarias de suministro

2021

ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA - ANAPOIMA

Con la viabilización del proyecto por parte del MVCT, el 14 de septiembre se suscribió convenio para la ejecución del proyecto

Valor: \$29.309.626.898

Nación:	\$15.000.000.000
Tasa Compensada Departamento	\$10.267.154.444
Recursos Propios Departamento:	\$ 4.042.472.454



ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA - ANAPOIMA

Convenio de
Cooperación No.
298 de 2017



Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio



FINDETER



Empresas Públicas de Cundinamarca



La Mesa



Anapoima



ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA - ANAPOIMA

Construcción y Puesta en Marcha del Acueducto Regional La Mesa - Anapoima

Ejecución del proyecto en 14 meses



**Etapla 1: Acompañamiento en la
Gestión Predial, Social y Ambiental**
(2 meses)


Etapla 2: Ejecución de obra
(12 meses)



ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA - ANAPOIMA

Ejecución de obra en 12 meses

(5 frentes de obra)

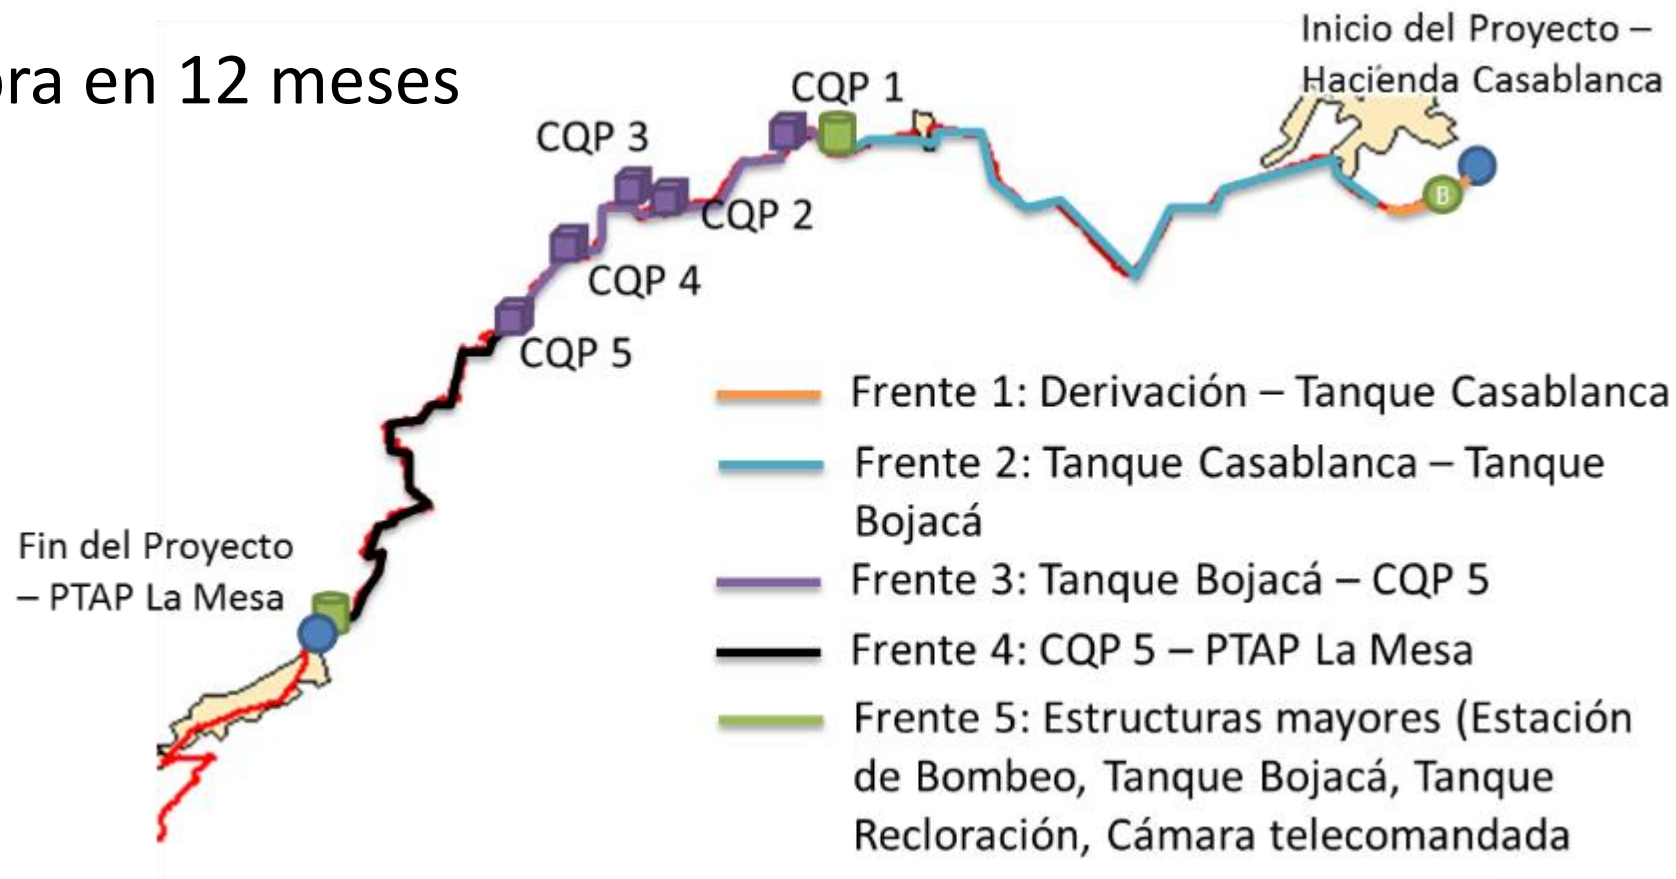

EMBALSE DE CALANDAIMA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El objeto del proyecto del Embalse de Calandaima es el suministro de agua para los acueductos urbanos de los municipios de Apulo, El Colegio, Tocaima y Viotá, y veredales (18), incluyendo algunos acueductos veredales de Anapoima durante los meses o períodos de estiaje en que sus fuentes de suministro normales no son suficientes para atender la demanda.

ESTADO ACTUAL

- En trámite de licenciamiento ambiental.
- A la espera de inicio de audiencia pública.

BENEFICIADOS

- 18 Acueductos veredales de los municipios de Apulo, El Colegio, Viotá y Anapoima (sector Patio Bonito)
- 4 acueductos municipales: Apulo, El Colegio, Viotá y Tocaima

INVERSIÓN

\$ 61.254.255.891



Sitio de Embalse. Fuente: Secretaria de TIC



EMBALSE DE CALANDAIMA

COMPRA DE PREDIOS

Se requiere la compra parcial o total de quince (15) predios. A la fecha se han adquirido dos (2) del municipio de El Colegio y dos (2) del municipio de Viotá. Las demás adquisiciones están en trámite.



ACUEDUCTO REGIONAL DE LA SABANA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Habilitar una infraestructura que permita a los municipios de la cuenca alta y media del río Bogotá tener agua de óptima calidad.

Concesión de agua de un sistema de Acueducto Regional para la cuenca alta del río Bogotá y cuya área de estudio comprendió los cascos urbanos, centros poblados y áreas circundantes de un total de 6 municipios (Gachancipá, Tocancipá, Sopó, Tabio, Tenjo y Cajicá) de la cuenca del río Bogotá que requieren abastecimiento y no disponen de fuentes suficientes a corto y mediano plazo.

ESTADO ACTUAL:

Se encuentra en una etapa en la cual EPC esta buscando posibilidades de financiamiento según los estudios de sensibilidad que se han hecho con respecto a la propuesta.



ACUEDUCTO REGIONAL DE LA SABANA

BENEFICIADOS:

Los municipios de Gachancipá, Tocancipá, sopó, Tabio, Tenjo y Cajicá.

COMPRA DE PREDIOS:

Sujeto a resultados de los estudios y diseños.



INVERSIÓN:

La inversión aproximada del proyecto según los estudios realizados será de 309,000 millones de pesos.

NUEVOS NEGOCIOS



PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Cofinanciar una planta de aprovechamiento de residuos sólidos en el norte del departamento; por medio de la búsqueda de una alianza estratégica con una empresa privada, la cual haya sido seleccionada después de una metodología desarrollada por la EPC para su selección y también de la mano de los municipios que se beneficiaran de este proyecto.

ESTADO ACTUAL:

El pasado 26 de octubre se realizó la presentación por parte de los empresarios interesados en acompañar a la EPC en el proceso para llevar a cabo el proyecto de la planta de aprovechamiento de residuos sólidos del norte del departamento; actualmente nos encontramos a la espera de recibir respuesta por parte de los empresarios a las preguntas que surgieron en la presentación del pasado 26 de octubre.



PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO

BENEFICIARIOS:

Ubaté, Simijaca, Susa, Guachetá,
Lenguazaque, Carmen de carupa, Tausa,
Cucunuba, Fúquene, Sutatausa,
Subachoque, Zipaquirá, Tocancipá, Sopó,
Cogua, Gachancipá, Nemocón, Cajicá,
Chía, Tabio, Tenjo, Cota, Guasca, Gachetá,
Ubalá, Junín, Guatavita, Gachalá, Gama, La
calera, Chocontá, Villa Pinzón, Suesca,
Sesquilé, Machetá, Manta, Tibirita,

INVERSIÓN:

Se determinará una vez se haya escogido el aliado estratégico quien acercará a la EPC un presupuesto de inversión.



COMPRA DE PREDIOS:

No se han realizado compra de predios, ya que el proyecto se encuentra en etapa de evaluación de las propuestas; vale la pena aclarar que eventualmente para el desarrollo del proyecto e deberá hacer inversión en predios, sin embargo, es una etapa que tendrá lugar una vez se haya seleccionado la mejor propuesta.

VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:

El valor de los estudios y diseños se conocerá una vez se tenga seleccionado al aliado con quien a su vez ya se debe tener un memorando de entendimiento.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

El proyecto contempla la construcción de 406 unidades sanitarias,, las unidades a construir tendrán un área de 3.45 metros cuadrados dotados con cubierta, sistemas eléctrico e hidrosanitario, enchape y pisos. Teniendo como objetivo la separación de las aguas grises (ducha y Lavamanos) de las aguas negras. Cada unidad sanitaria contara con lavamanos, sanitario, ducha y un sistema compuesto por Caja de inspección, trampa de grasas, tanque séptico, filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA), caja de distribución y campo de infiltración.

ESTADO ACTUAL:

Viabilizado y en trámites financieros para empezar la contratación.



BENEFICIADOS:

beneficiando a igual numero de familias en 12 municipios del Departamento, entre los cuales se encuentran 4 municipios del Zomac (Guayabal de Siquima, Cabrera, La Palma y Paratebueno)

INVERSIÓN:

4.999.900.475.

COMPRA DE PREDIOS:

No se hará compra de predios puesto que las construcciones se harán en las viviendas para lo cual se solicitó certificado de sana posesión.

VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:

20.000.000



NUEVOS NEGOCIOS

“CONVENIO CON LA POLICIA”

“ESTUDIOS, DISEÑOS Y PERMISOS PARA LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL CENTRO VACACIONAL MELGAR SEDE B DE LA POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL”

VALOR: \$ 607.742.857

ESTADO ACTUAL: Se encuentra en etapa final de solicitar permisos y diseños.



PANDI

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Operar empresas de servicios públicos domiciliarios en Cundinamarca a nivel local y/o regional.

ESTADO ACTUAL:

El proyecto contempló la conformación de una empresa de servicios públicos domiciliarios, donde los accionistas fueron Empresas Publicas de Cundinamarca, con una participación accionaria del 49% y el municipio de Pandi Cundinamarca con una participación del 51%. Esta sociedad anónima simplificada fue denominada EMPANDI SAS ESP el cual prestara el servicio de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de Pandi y es operada por el socio especializado.



PANDI

BENEFICIADOS:

Con el proyecto actualmente se están beneficiando 2.450 personas del casco urbano del municipio de Pandi, y se pretende beneficiar a corto plazo una población aproximada de 4.900 personas que habitan las veredas altas de los municipios de Venecia, San Bernardo y Pandi

INVERSIÓN:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	ACCIONES SUSCRITAS	CAPITAL REPRESENTADO EN USO INFRAESTRUCTURA	CAPITAL REPRESENTADO EN APORTES EN EFECTIVO	CAPITAL PAGADO
Municipio de Pandi	\$343.469.190	510	\$343.469.190	-0-	\$343.469.190
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.	\$329.999.810	490	-0-	\$329.999.810.00	\$247.499.857
TOTALES	\$673.469.000	1000	\$343.469.190	\$329.999.810.00	\$590.969.047

ADMINISTRATIVA



RESPONSABILIDAD SOCIAL

PARTICIPACION DE CONCURSOS O CONVOCATORIAS.

- Premio Andesco de Sostenibilidad 2018: Se realizó la postulación y la empresa quedó como **finalista** en la categoría de pequeña empresa.
- Premio Nacional de Alta Gerencia: Se postularon diversos programas que está adelantando la empresa y se llegó a la etapa de **finalistas**.
-
- Mujeres Emprendedoras 2018: Ana Maria Barón, fue postulada y ganó por el derecho de habitar sano y productivo, gracias a las acciones afirmativas que esta cundinamarquesa ha llevado a cabo a lo largo de su actuar como lideresa.



ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL



CONTRATOS

Modalidad	ENE - OCT 2018	
	No. contratos	Valor en millones
Contratación Directa	316	15.068.274.841
Convenios y Contratos Interadministrativos	6	12.916.713.539
Licitación Pública	5	21.338.822.551
Concurso de Méritos	65	16.514.312.236
Selección Abreviada Subasta Inversa	1	1.627.920.000
Total	393	67.466.043.167

Fuente: Dirección de Gestión Contractual



CONTRATOS

Área o Dependencia	No. de Contratos	Valor
Área De Tesorería	1	21.250.000
Dirección Aseguramiento	30	1.357.319.001
Dirección Asuntos Ambientales	5	168.020.000
Dirección Contabilidad	4	147.149.333
Dirección Control Interno	3	131.467.000
Dirección De Nuevos Negocios	13	416.470.668
Dirección De Operaciones	43	1.804.060.133
Dirección De Planeación	6	183.600.000
Dirección Estructuración De Proyectos	47	1.475.137.676
Dirección Finanzas Y Presupuesto	7	280.866.667
Dirección Gestión Contractual	17	882.962.067
Dirección Gestión Humana Y Administrativa	24	608.466.637
Dirección Interventoría	12	251.033.999
Dirección Jurídica	7	274.059.983
Dirección Servicio Al Cliente	9	301.718.467
Gerencia General	3	91.983.333
Secretaria De Asuntos Corporativos	4	171.622.667
Subgerencia General	15	605.862.832
Subgerencia Operaciones	2	87.967.200
Subgerencia Técnica	6	301.030.000
TOTAL	258	9.562.047.663

Fuente: Dirección de Gestión Contractual



CONTRATOS

COMPRAS POR ACUERDOS MARCO DE PRECIOS 2018				
ORDEN N°	OBJETO	VALOR PROYECTADO	VALOR CONTRATADO	VALOR AHORRO
24544	COMBUSTIBLES	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00
25635	PAPELERIA	\$ 50.000.000	\$ 46.845.804,68	\$ 3.154.195,32
25710	3 VEHICULOS COMPACTADORES 25 YD3 FUSAGASUGA(1) LA MESA (1) TOCANCIPA (1)	\$ 1.404.462.663	\$ 1.298.127.954,00	\$ 106.334.709,00
25711	6 VEHICULOS COMPACTADORES 12 YD3 VERGARA(1) FOSCA (1) FUQUENE (1) MANTA (1) UBAQUE (2)	\$ 2.331.702.498	\$ 2.093.444.928,00	\$ 238.257.570,00
28171	2 VEHICULOS COMPACTADORES 16 YD3 TOCANCIPA(2)	\$ 827.109.426	\$ 757.570.956,00	\$ 69.538.470,00
28487	5 VEHICULOS COMPACTADORES 16 YD3 GUASCA(1) GUATAQUI(1) VILLETA (2) CAQUEZA(1)	\$ 2.067.773.565	\$ 1.893.208.107,50	\$ 174.565.457,50
29642	3 VEHICULOS COMPACTADORES 25 YD3 CAJICA (2) GACHANCIPA (1)	\$ 1.404.462.663	\$ 1.306.826.539,50	\$ 97.636.123,50
32044	COMBUSTIBLES	\$ 38.000.000	\$ 38.000.000	\$ 0,00
32412	4 VEHICULOS COMPACTADORES 12 YD3 SAN CAYETANO (1) LA PEÑA (1) TIBACUY (1) PANDI (1)	\$ 1.554.468.332	\$ 1.486.349.769,00	\$ 68.118.563,00
TOTALES		\$ 9.777.979.147	\$ 9.020.374.058,68	\$ 757.605.088,32

Fuente: Dirección de Gestión Contractual



CONTRATOS

PROCESOS EN SECOP II			
PROCESO	OBJETO	MUNICIPIO	VALOR PROYECTADO
CM-PDA-024-2018	ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS PARA DETERMINAR UNA FUENTE DE ABASTECIMIENTO ALTERNA PARA LA OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO SALIBARBA MUNICIPIO DE TABIO	TABIO	\$ 204.633.043
CM-PDA-027-2018	ANÁLISIS Y ACTUALIZACIÓN DE PREFACTIBILIDAD DE EMBALSES, INCLUYENDO OFERTA – DEMANDA PARA EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ	FACATATIVA	\$820,000,000



ADMINISTRATIVA

GESTIÓN JURIDICA



GESTIÓN JURIDICA A 30 DE OCTUBRE DE 2018

TIPO DE ACCIÓN JUDICIAL	DEMANDANTE EPC	DEMANDANDO EPC
ACCIONES CONTRACTUALES	9	16
ACCIONES DE REPARACIÓN DIRECTA	0	7
ACCIONES POPULARES	0	36
ACCIONES DE GRUPO	0	2
TRIBUNALES DE ARBITRAMIENTO	1	2
EJECUTIVOS	5	2
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	0	2
TOTAL	15	67



ADMINISTRATIVA

RECURSOS HUMANOS



PLANTA DE PERSONAL A OCTUBRE 2018

NIVEL	NÚMERO DE FUNCIONARIOS
GERENTE	1
SUBGERENTE GENERAL	1
SECRETARIA DE ASUNTOS CORPORATIVOS	1
SUBGERENTE DE OPERACIONES	1
SUBGERENTE TÉCNICO	1
DIRECTOR I	9
DIRECTOR II	5
TESORERA	1
ASESOR	1
PROFESIONAL MASTER	4
PROFESIONAL SENIOR	9
PROFESIONAL JUNIOR II	2
PROFESIONAL JUNIOR I	2
TÉCNICO ASISTENCIAL	6
TOTAL	44



PLAN DE BIENESTAR



SEMANA DE LA SALUD Y DEL BIENESTAR

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

DÍA DE LA SECRETARIA

SEMANA DE LA SALUD

CINE FAMILIAR

DIA DEL SERVIDOR PÚBLICO



PLAN DE CAPACITACIÓN



INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y
GERENCIA DE PROYECTOS

NORMAS ISO 9001-2015

TALLER INTERVENTORÍA DE DISEÑOS DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PARA ZONAS URBANAS Y RURALES



RECERTIFICACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

NORMA ISO 9001:2015

En el mes de Agosto de 2018, Empresas Publicas de Cundinamarca S.A. ESP., obtuvo recertificación bajo la Norma ISO 9001:2015, por Bureau Veritas, arrojado como resultado Cero No Conformidades, demostrando el compromiso de la alta dirección y sus colaboradores en la implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión.





MUCHAS GRACIAS

